

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

Comune di Cesena - Laboratorio falegnami

Descrizione:

Comune di Cesena - Laboratorio falegnami - Verifica di conformità legislativa

Data:

23-10-2018

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

CESENA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ing. Massimo Moretti

Note:

Premessa


A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	No	Sistemare e riordinare le varie aree sia in falegnameria sia nel deposito muratori
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Sistemare e riordinare le varie aree sia in falegnameria sia nel deposito muratori
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Predisporre specifica valutazione per area raccolta polveri e zone taglio/lavorazioni legno
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	
Se le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Scale e rampe mantenute pulite da ingombri	Si	

Comune di Cesena - Laboratorio falegnami

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Adeguare l'altezza della scala verso il soppalco
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	No	Parapetto soppalco falegnameria inferiore ad 1m
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Deposito muratori: rimuovere i materiali sopra al WC

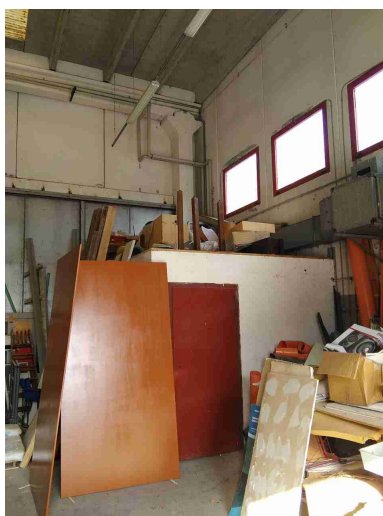

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Predisporre cartello con indicazione della portata massima delle scaffalature
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Predisporre rastrelliere per il deposito delle tavole; non sovrapporre una su l'altra

Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	No	Effettuare pulizia generale approfondita dei vari macchinari e aree di lavoro e deposito, in quanto presenti ingenti quantità di polvere
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	No	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Da recuperare. Rimuovere i prodotti non più utilizzati (es. vecchi scarti di vernice, stucchi, ecc.)
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	Predisporre armadietto metallico con bacino di contenimento per i prodotti infiammabili (vedi foto di esempio)

Rischi chimico e cancerogeno



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	

Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	

Firme		
Referente Aziendale	Data 23-10-2018	X
Consulente Alessandro Versari	Data 23-10-2018	
