

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI TALAMELLO - MUNICIPIO

Descrizione:

COMUNE DI TALAMELLO - MUNICIPIO - Verifica di conformità legislativa

Data:

28-07-2022 09:58:32

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

TALAMELLO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Rossi Ivo

Note:


Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	No	procedere con l'individuazione di n.2 D.L. (settore tecnico + amministrativo/scuole). Il DVR di Maggio 2021 è firmato da Rossi e dal Sindaco Novelli Pasquale. Predisporre delibera di giunta per l'individuazione dei n. 2 D. L.
E' stato nominato un medico competente?	Si	reperita la nomina del M.C. Dott. galli e valida fino al 31-05-2023
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Procedere all'individuazione del RLS
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	da individuare e formare almeno n.4 addetti
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	da individuare e formare almeno n.4 addetti
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	Le P.O. Hanno assunto il ruolo di D. I.
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	procedere con la Valutazione specifica
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	
E' presente il piano di emergenza?	Si	predisposto per la sede municipale e ufficio tecnico.
Documenti di Gestione		
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	predisporre verbale di consegna DPI per le cuoche
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	Archivio comunale CPI del 2019

Documenti di Gestione		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	programmato a per fine 2022. PDE DI Maggio 2021
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	predispone registro per Archivio e scuola elementare
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	manca per sede ufficio tecnico e magazzino
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Verificare per palazzina uff. Tecnico
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	per tutti gli edifici

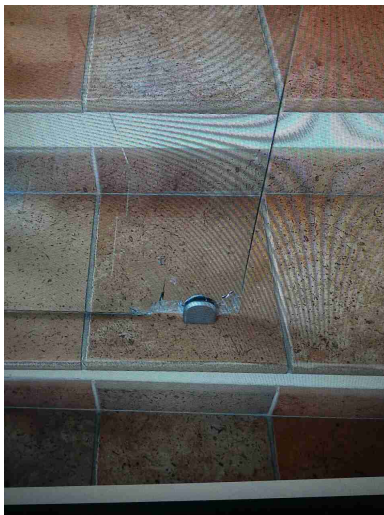Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	da verificare le scadenze per tutti gli edifici
L' edificio e' autoprotetto?	No	reperire esito della valutazione per tutte le sedi ad eccezione delle scuole per le quali è presente
Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	sede uff. tecnico: sostituire il vetro della porta di accesso alla scala di collegamento piano terra - piano primo
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	sede uff. tecnico e municipio: fissare lo zerbino all'ingresso
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	segnalare la presenza di porte a vetri a tutta altezza con idonee vetrofanie (tromba scala Municipio)

Sicurezza delle strutture

Segnalazione aggiuntiva n. 3

No

archivio corrente: eliminare il materiale depositato a terra, installare almeno n. 1 altro estintore a polvere, eliminare gli spazi stretti (minimo 60 cm), installare cartellonistica di evacuazione.
Archivio distaccato: presenta spazi stretti



Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

No

Municipio e archivio distaccato: posizionare gli estintori a parete a 1.5 m di altezza da terra o in alternativa posizionarli su di una piantana porta estintore

Prevenzione incendi



Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?



No

MUNICIPIO: installare cartellonistica indicante la valvola di intercettazione del metano




Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

Sì

Prevenzione incendi		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	identificare per Municipio e la sede dell' uff. tecnico la cartellonistica indicante il punto di raccolta sulla pizza antistante
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	No	il registro Antincendio archivio non risulta aggiornato: aggiornare
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	predisporre planimetrie di evacuazione inviare DWG a SEA che si occuperà di redigere le planimetrie
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	MUNICIPIO sottotetto: eliminare il materiale cartaceo depositato a terra e limitare il quantitativo di carta sempre inferiore a 50 quintali
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	installare sui gradini delle scale

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

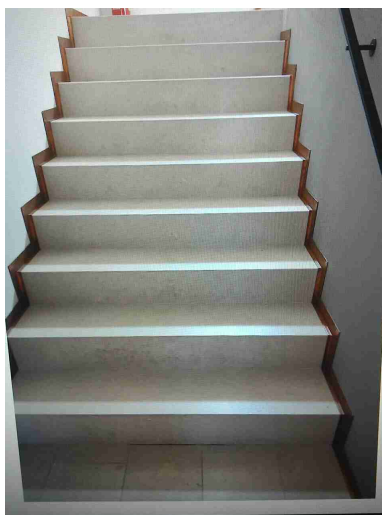

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

archivio distaccato: dotare la sede di scala portatile a norma

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Si

Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza

No


eseguire verifica periodica semestrale delle luci di emergenza e inserire l'esito all'interno del registro Antincendio

Rischio elettrico


Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?

No

installare cartellonistica indicante il pericolo di elettrocuzione e il divieto di spegnimento con acqua.

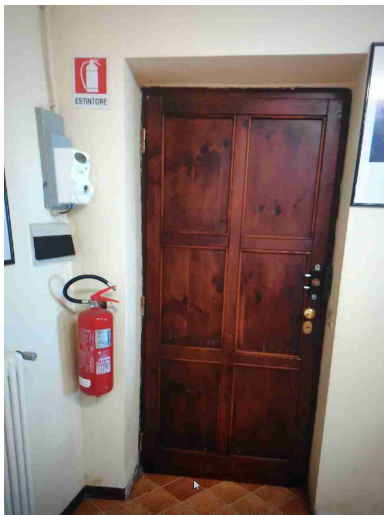Rischio elettrico		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	sede uff. tecnico: installare la cartellonistica indicante il pulsante di sgancio elettrico
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	casa della musica: installare sul quadro elettrico la cartellonistica indicante il pericolo di elettrocuzione e il divieto di spegnimento con acqua
Rischi chimico e cancerogeno		
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	MUNICIPIO: installare armadio idoneo al contenimento delle sostanze chimiche pericolose impiegate per la pulizia degli uffici

Rischi chimico e cancerogeno

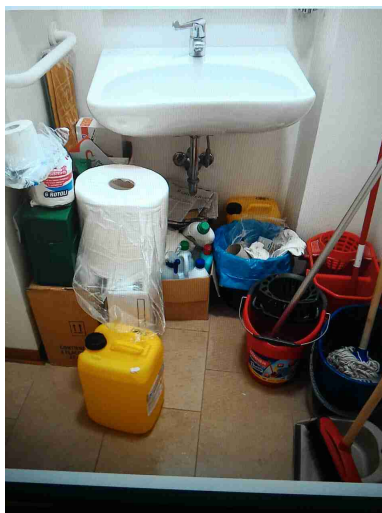


Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	installare la cartellonistica indicante la cassetta di primo soccorso

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	No	sede uff. tecnico e municipio: eliminare il materiale posizionato al di sopra delle scaffalature. Archivio distaccato: le scaffalature mancano della cartellonistica indicante la portata massima ammessa inoltre non risultano fissate a parete, a terra e controventate
--	----	--

Rischi ufficio

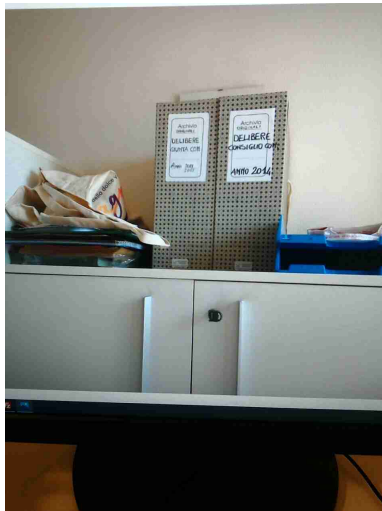

Buona condizione delle sedie?

Si


Scrivanie in buone condizioni?

Si

I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?

No

sede uff. tecnico: raccogliere i cavi sparsi in idonee canaline passacavo o spirali raccogli cavi

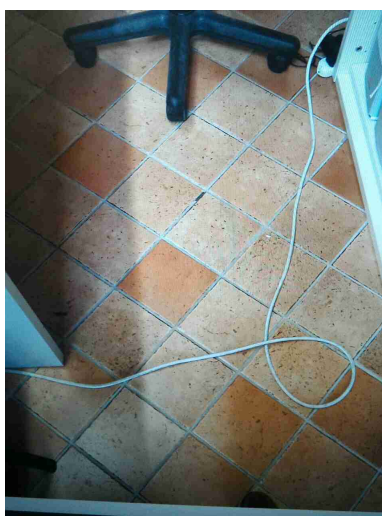

Rischi ufficio		
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	No	sede uff. tecnico: installare tende alla veneziana alle finestre (finestra che si affaccia sulla Piazza)
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	gli armadi non risultano ancorati alle pareti
Firme		
Referente Aziendale	Data 28-07-2022 09:58:32	X
Consulente Ceccarelli Michele	Data 28-07-2022 09:58:32	
